

EDIM 사업수행계획서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 사업수행계획서

EDIM Tool System 구축 사업의 **범위·조직·일정·관리 체계**를 정의하는 착수 문서. 계약 조건(시작일·투입 인력·범위 협의 4건)이 확정되면 v1.0으로 승격하며, 그 전까지는 WBS와 동일한 **가정 기반 초안**으로 운영한다.

항목	내용
문서 버전	v0.1 (초안 — 계약 확정 전 가정 기반)
작성일	2026-07-11
사업명	EDIM Tool System 구축 (CTO/ETO 제조기업용 통합 비즈니스 플랫폼)
관련 문서	개요 · WBS · 위험관리대장 · 보안관리계획서 · 산출물목록
일정 가정	W1 = 2026-08-03(월) 시작, 총 44주 — 계약 확정 시 WBS START 재산정

1. 사업 개요

1.1 목적

EDIM(Enterprise Digital Integration Management)은 CTO(Configure-to-Order)·ETO(Engineer-to-Order) 제조기업의 **CPQ + PLM + ERP + Digital Twin**을 하나로 통합하는 플랫폼이다. 핵심 가치: **제품 구성(Configuration)**을 선택하면 **생산에 필요한 모든 자료(BOM·도면·기술자료·견적·ERP 데이터)**가 자동 생성된다 — Document 준비시간 1시간 이내 (기존 수일 소요 업무).

1.2 추진 배경·근거

- 원천 요구: `reference/EDIM Tool System EP2.pptx` (NOVA Solution, 78슬라이드) — [개요](#)로 분석 완료
- 분석·설계 산출물 선행 완료: 요구사항 80건 → 기능 179건 → 메뉴 98 → 화면 24 → 컴포넌트 39 → DB 54테이블, RTM 커버리지 179/179
- 선행 검증(PoC) 완료**: 개발 서버(edim.seekerslab.com)에 24화면 전량 + 실 DB(PostgreSQL 16) 연동 + Macro 엔진·EDIM Run 실 파이프라인(BOM→치수→DXF→견적 PDF)·CAD(DXF)·i18n 런타임 구축 — 본사업 착수 시 이 코드가 기준선(baseline)이 된다


1.3 수행 범위

구분	범위
기능	14모듈 179기능 (기능정의서) — CPQ·PLM·Code Set-up·ERP·Toolbox·공통·Mobile
화면	98메뉴 · 24대표화면 + 상세 4종 — 전 화면 Dense(B안) 디자인 확정
데이터	DB 54테이블 462컬럼, 데이터 이행 9대상 (데이터이행계획서)
AI	도면·서류 학습(RAW DB→RAG)·Macro/UI 생성 보조 — Platform 전용 학습 관리
배포	SaaS 멀티테넌트 + Self-managed Server 패키지 검용 (REQ-N-018)

범위 협의(미확정) 항목 — M1(요구 확정) 전 결정 필수, [위험관리대장](#) 연동:

- 1. DUCT 건축 설비 모듈 포함 여부 (별도 견적 사안)
- 2. ERP 자체 구현 vs 기존 ERP 연계(INT-01) 경계
- 3. 보안 솔루션(DRM 등) 연계 범위 (DOC-004)
- 4. CAD 명령표(슬라이드 61)의 사양/참고 여부 · ODA 라이선스 · Digital Twin 연계 스펙

2. 수행 조직·역할

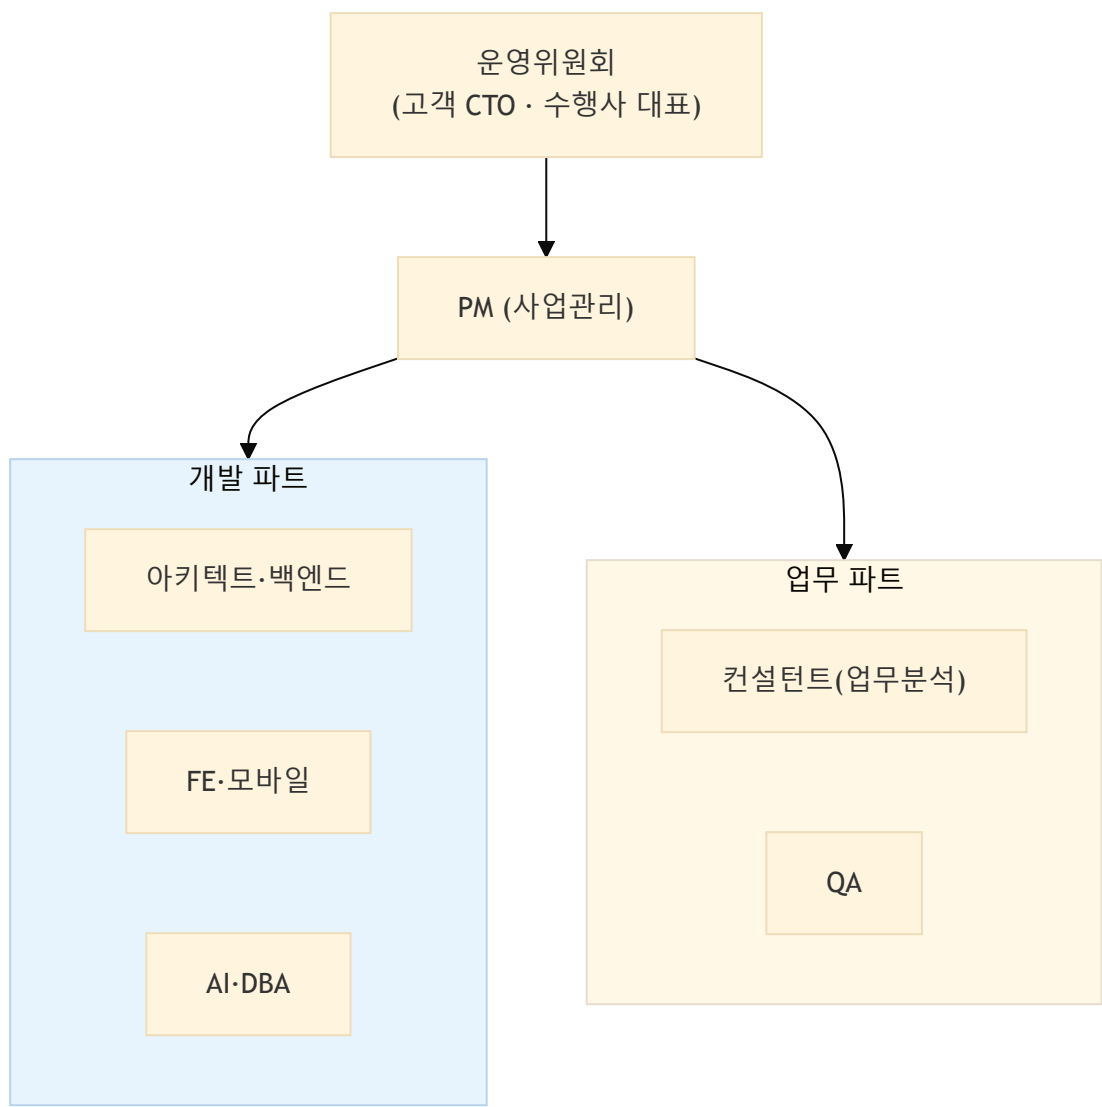

2.1 투입 인력(안) — 계약 협의 대상

PM 1 · 아키텍트 1 · 백엔드 2~3 · FE 2 · 모바일 1 · AI 1 · DBA 1 · QA 1 · 컨설턴트 1 (WBS 문서정보와 동일)

2.2 역할·책임 (R&R)

역할	책임	주요 산출물
PM	일정·범위·위험·보고 총괄, 변경 통제	사업수행계획·주간보고·위험관리대장
아키텍트	기술 표준·구조 설계, 코드 리뷰 게이트	개발표준·클래스/컴포넌트 정의서
백엔드/FE/모바일	모듈 구현 + 단위테스트 (커버리지 80%)	P1~P5 모듈·테스트 결과
AI	학습 파이프라인·Macro/UI 생성 보조	학습 DB·품질 리포트
DBA	물리 설계·마이그레이션·이행	DDL·이행 결과서

역할	책임	주요 산출물
QA	통합·성능 시험, FVT 준비	테스트 결과·결함관리대장
컨설턴트	AS-IS 조사·업무 검증·교육	현행분석서·교육 자료
고객사	원천 자료 제공·업무 검증·검수, 협의 4건 의사결정	요구 확정·FVT 승인

3. 일정 계획

구조는 SI 8단계 × 개발 Phase(P1~P5, 중첩 진행) — 상세는 WBS (38 Task·44주 간트).

단계	주차	핵심 내용
1 착수	W1~2	킵오프·수행계획 확정, CI 파이프라인, 개발표준 v1.0
2 분석	W3~6	AS-IS 조사, 요구 확정(협의 4건), 이행 대상 조사
3 설계	W7~12	화면·DB·인터페이스·클래스 v1.0
4 구현	W9~36	P1 RCCS 코어 → P2 설계·Run → P3 원가·문서 → P4 Toolbox·AI → P5 ERP·모바일
5 테스트	W31~38	통합 E2E·성능(REQ-N-001~005)·결함 조치·FVT 준비
6 이행	W35~40	데이터 이행·AI 학습·운영 환경 구축
7 안정화	W39~42	파일럿 운영·교육·매뉴얼
8 종료	W43~44	FVT 검수·인수인계

마일스톤: M1 요구 확정(W6) · M2 설계 완료(W12) · M3 핵심 E2E 데모(W20 — 코드 등록→CPQ→Run→도면·견적 자동 생성) · M4 검수(W43)

4. 관리 체계

4.1 보고·회의

구분	주기	내용
주간 보고	매주	진척(WBS 대비)·이슈·차주 계획
단계 검토회	M1~M4	산출물 승인 게이트 — 검토회의록
운영위원회	월 1회	범위·일정 변경, 위험 에스컬레이션
이슈 처리	수시	48시간 내 1차 응답, 지연 시 운영위 상정

4.2 산출물·형상 관리

- 단일 레지스터: 산출물목록 — 신규 문서는 레지스터 등록이 선행
- docs-as-code: MD/생성 스크립트가 원본, xlsx·PDF·포털은 재생성 (docs/README §4 절차 준수)
- 추적 체계: REQ → 기능 → 메뉴 → 화면 → 컴포넌트 → DB → FVT, RTM 자동 검증(미연결 0 유지)
- 버전 규칙: v0.x 초안 반복 → 고객 승인 시 v1.0. Git 단일 저장소, 커밋·리뷰 표준은 개발표준 §6

4.3 변경 관리

- 변경요청(CR) 접수 — 요구·범위·일정 영향 기술
- 영향 분석 — RTM으로 파급 범위(기능→화면→DB) 자동 식별
- 운영위 승인 → WBS·산출물 개정 (개정 트리거는 개발표준 §12 연동)

4.4 위험·보안 관리

- 위험: 위험관리대장 — 주간 보고 시 갱신, 등급 심각 항목은 운영위 상정
- 보안: 보안관리계획서 — 개발·데이터·문서·인프라 보안 기준과 사고 대응 절차
- 품질: 단위테스트 커버리지 80%·통합 E2E·성능시험 합격 기준은 개발표준 §7 및 FVT 연동

5. 전제 조건·제약

- 시작일·투입 인력·범위 협의 4건은 계약 시 확정 — 확정 전 수치는 모두 가정
- Macro Excel 호환 문법은 특허 검토 결과에 따라 조정될 수 있음 (REQ-N-021)
- 고객사는 원천 자료(코드·도면·단가) 추출과 업무 검증 인력을 제공한다 (데이터이행계획서 §6)

변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-07-11	최초 작성 — WBS v0.1·산출물목록 v0.1 기준, 계약 확정 전 가정 기반 초안
